



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011613000to061316020212011612900		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قراردادار پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۴:۵۶:۲۵		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۱		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۰.۸۳		۰.۱۷				۶۰.۲۸-		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری				دلیل توقف ویدئومتری			
	در جهت جریان				۴۰.۸۳							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score:۰										



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۲:۵۶:۲۵	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	۳	۳	F	A	D	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۴۱	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب اتراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۰۱	۱.۰۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۰۵	۱.۳۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۵	۰۰:۴۶	۶.۹۹		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۰:۵۴	۶.۹۹		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۷	۰۱:۳۸	۱۷.۶۱		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۱:۴۳	۱۷.۹۵		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۹	۰۲:۰۸	۲۳.۸۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۰	۰۲:۴۰	۳۱.۸۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۲:۴۳	۳۲.۱۱		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۱۲	۰۰:۰۰	۴۰.۸۳		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011613000to061316020212011612900	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	
۰.۱۷	طول ویدئومتری نشده	۴۰.۸۳	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۰۱	۱.۰۴	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۴	۰۰:۰۵	۱.۲۵	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۵	۰۰:۴۶	۶.۹۹	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۶	۰۰:۵۴	۶.۹۹	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۷	۰۱:۳۸	۱۷.۶۱	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۸	۰۱:۴۳	۱۷.۹۵	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۹	۰۲:۰۸	۲۳.۸۵	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۱۰	۰۲:۴۰	۳۱.۸۲	CX	اجرا دهی / اتصال جانبر معیوب / اتصال معیوب اشعاع
۱۱	۰۲:۴۳	۳۲.۱۱	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۲	۰۰:۰۰	۴۰.۸۳	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریا کار یزد شرکت آب و فاضلاب تهران			گزارش تصویری	
شرکت دریا کار یزد			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	L316020212011613000to0613160202120116129	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱.۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱.۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱.۰۴ کد CX



شماره تصویر ۴
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱.۳۵ کد CX



شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۶.۹۹ کد CX



شماره تصویر ۶
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۶.۹۹ کد RF

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011613000to0613160202120116129	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۷.۶۱
کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۱۷.۹۵
کد RF



شماره تصویر ۹
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۳.۸۵
کد CX



شماره تصویر ۱۰
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۱.۸۲
کد CX



شماره تصویر ۱۱
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و کاهشی سطح مقطع به میزان ٪ در صد
موقعیت ۳۲.۱۱
کد RM



شماره تصویر ۱۲
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
موقعیت ۴۰.۸۳
کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011613000to061316020212011612900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۶.۲۸	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۶.۲۸

شیب بر حسب موقعیت

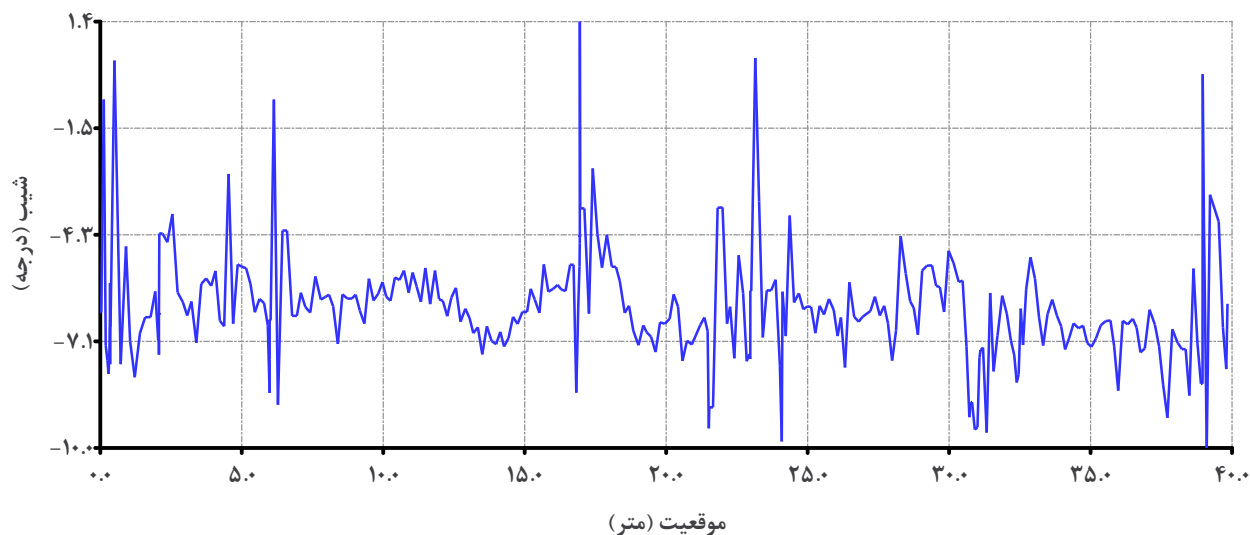

ارتفاع بر حسب موقعیت

