



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش			۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011608100to061316020112011634800									
ویژگی پروژه			نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر									
			شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ...		-									
ویژگی بستر پروژه			پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)													
			شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱													
آدرس پروژه			استان		شهرستان		آدرس													
			تهران		تهران		خیابان شقایق													
ویژگی ویدئومتری			هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟							
			بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۹:۲۵:۳۲		بلی							
ویژگی آدمرو			آدمرو		شماره مرجع آدمرو		شماره آدمرو		عمق آدمرو		تعداد مجرا		پله		نوع دریچه		نوع آدمرو			
			پایین دست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰		۳		۲		دارد		چدنی		سالم		بتنی	
			بالادست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰		۳		۲		دارد		چدنی		سالم		بتنی	
ویژگی فاضلابرو			طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس									
			۴۱		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن									
نتیجه ویدئومتری			طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری									
			۴۰.۲۱		۰.۷۹				۶۰.۱		مسیر لوله کامل طی شد									
			مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری													
			در جهت جریان																	
			خلاف جهت جریان		۴۰.۲۱															
			توضیحات		تست ۳۴۵ ; GainScore:۴ ; Structure Score:۰															

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۰۹:۲۵:۳۲	خیابان شقایق	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
B	A	N	D	A	۴۱	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۲۲	۵.۱۴		OJ			اتصال باز / به میزان % قطر						
۴	۰۰:۲۹	۵.۱۴		RM	دارد		نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۵	۰۲:۲۷	۲۸.۳۷		OJ			اتصال باز / به میزان % قطر						
۶	۰۲:۳۱	۲۸.۷۷		RM	دارد		نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۷	۰۳:۰۴	۳۳.۷۹		OJ			اتصال باز / به میزان % قطر						
۸	۰۳:۰۷	۳۳.۹۸		RM	دارد		نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۹	۰۴:۱۴	۴۰.۲۱		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت مهندسی دریا کار یزد شرکت دریا کاریز			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011608100to061316020112011634800	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	
۰.۷۹	طول ویدئومتری نشده	۴۰.۲۱	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه ع, شوه	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۲۲	۵.۱۴	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۴	۰۰:۲۹	۵.۱۴	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % ۱۰
۵	۰۲:۲۷	۲۸.۳۷	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۶	۰۲:۳۱	۲۸.۷۷	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % ۱۰
۷	۰۳:۰۴	۳۳.۷۹	OJ	سازه ای,	/ اتصال, ناز	به میزان, % قطر
۸	۰۳:۰۷	۳۳.۹۸	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان % ۱۰
۹	۰۴:۱۴	۴۰.۲۱	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو


 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011608100to061316020112011634	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	

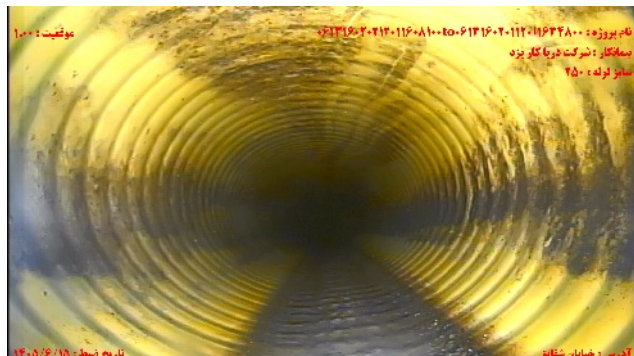


شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH

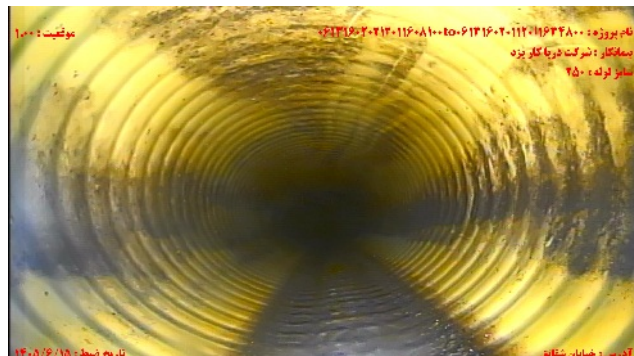


شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵

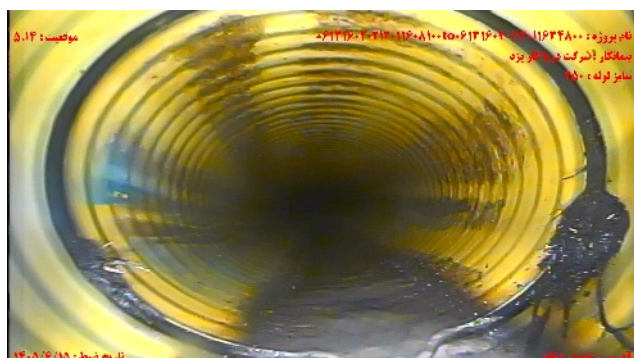


شماره تصویر ۳
عنوان اتصال باز / به میزان % قطر
موقعیت ۵۰۱۴ کد OJ

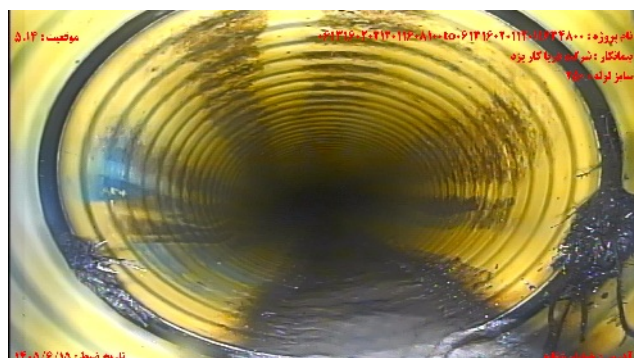

شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان %
موقعیت ۵۰۱۴ کد RM
درصد ۱۰

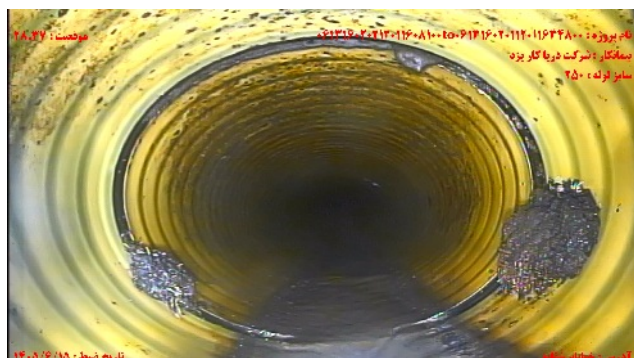


شماره تصویر ۵
عنوان اتصال باز / به میزان % قطر
موقعیت ۲۸۰۷۷ کد OJ

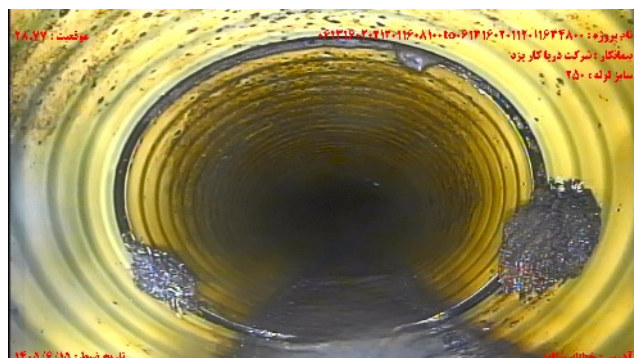


شماره تصویر ۶
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان %
موقعیت ۲۸۰۷۷ کد RM
درصد ۱۰

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011608100to061316020112011634	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت	

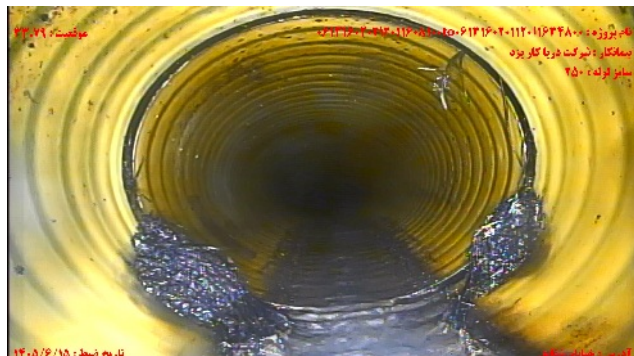

شماره تصویر ۷ موقعیت ۳۳.۷۹ کد OJ
عنوان اتصال باز / به میزان % قطر

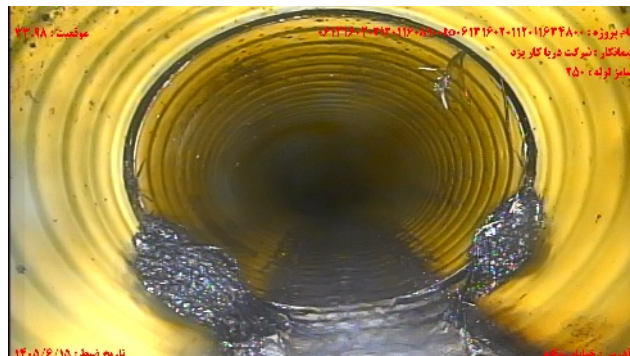

شماره تصویر ۸ موقعیت ۳۳.۹۸ کد RM
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ انبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰



شماره تصویر ۹ موقعیت ۴۰.۲۱ کد MHF
عنوان نقطه ی پایان آدمرو



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011608100to061316020112011634800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۶۰۱	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۶۰.۱ %

شیب بر حسب موقعیت

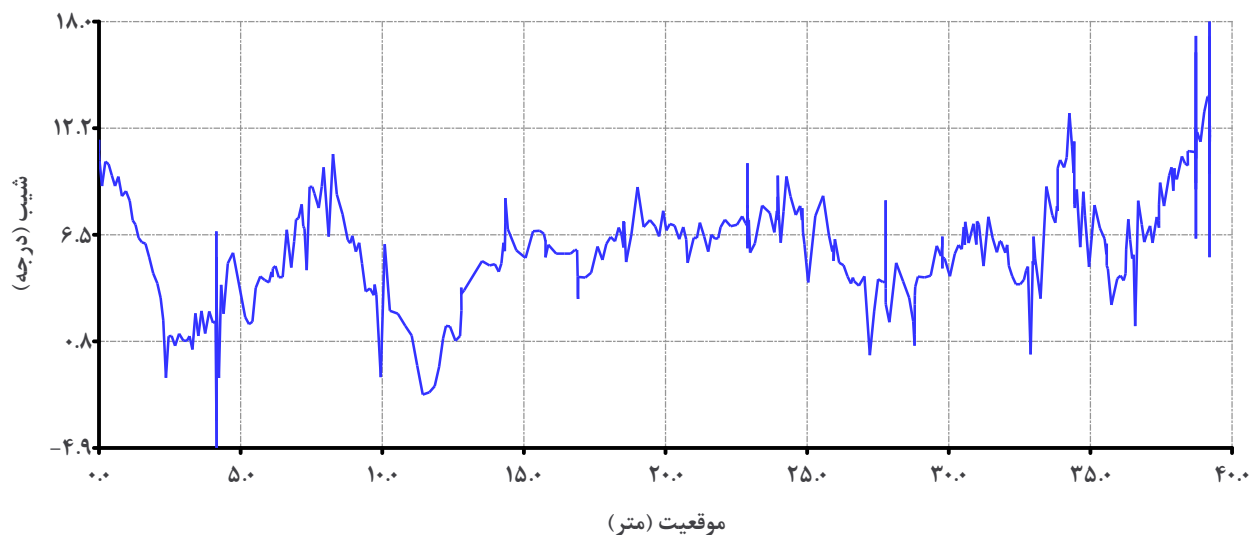

ارتفاع بر حسب موقعیت

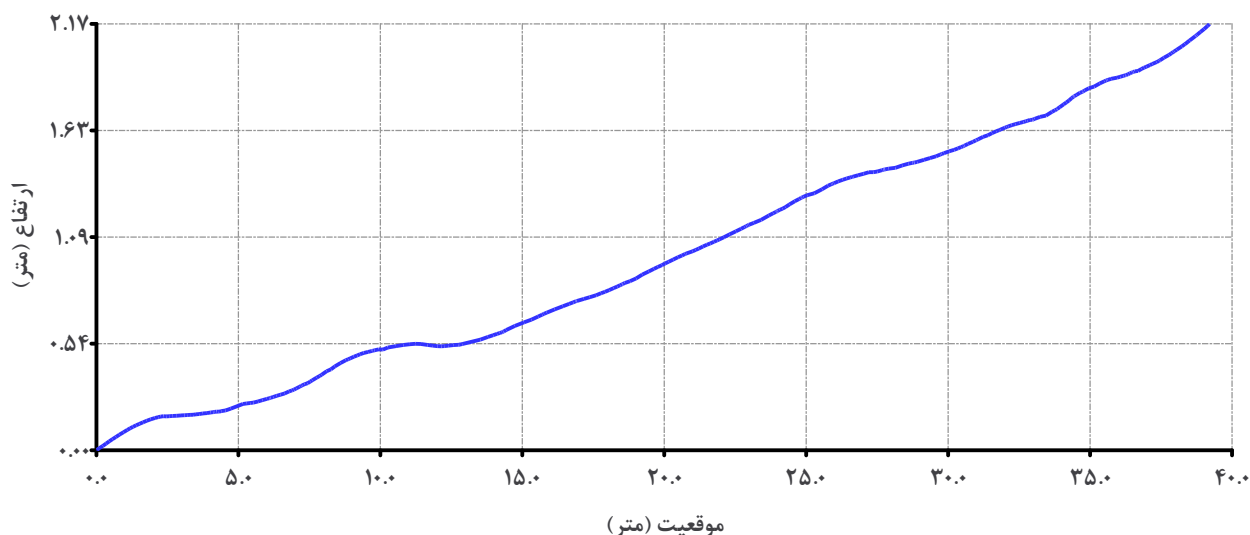

شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۰۸۱۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۱۱۶۳۴۸۰۰
